


### Sanierung Grundschule - Kostenverfolgung

■ Kostenschätzung Büro Meuer f Beschlüsse BPA v 20.06.2023, 06.02.2024, 07.05.2024, 19.11.2024  
 ■ Prognose Endkosten  
 ■ Zahlungen  
 % von Endkosten beauftragt

Mehr-/Minderkosten: siehe Aufstellung

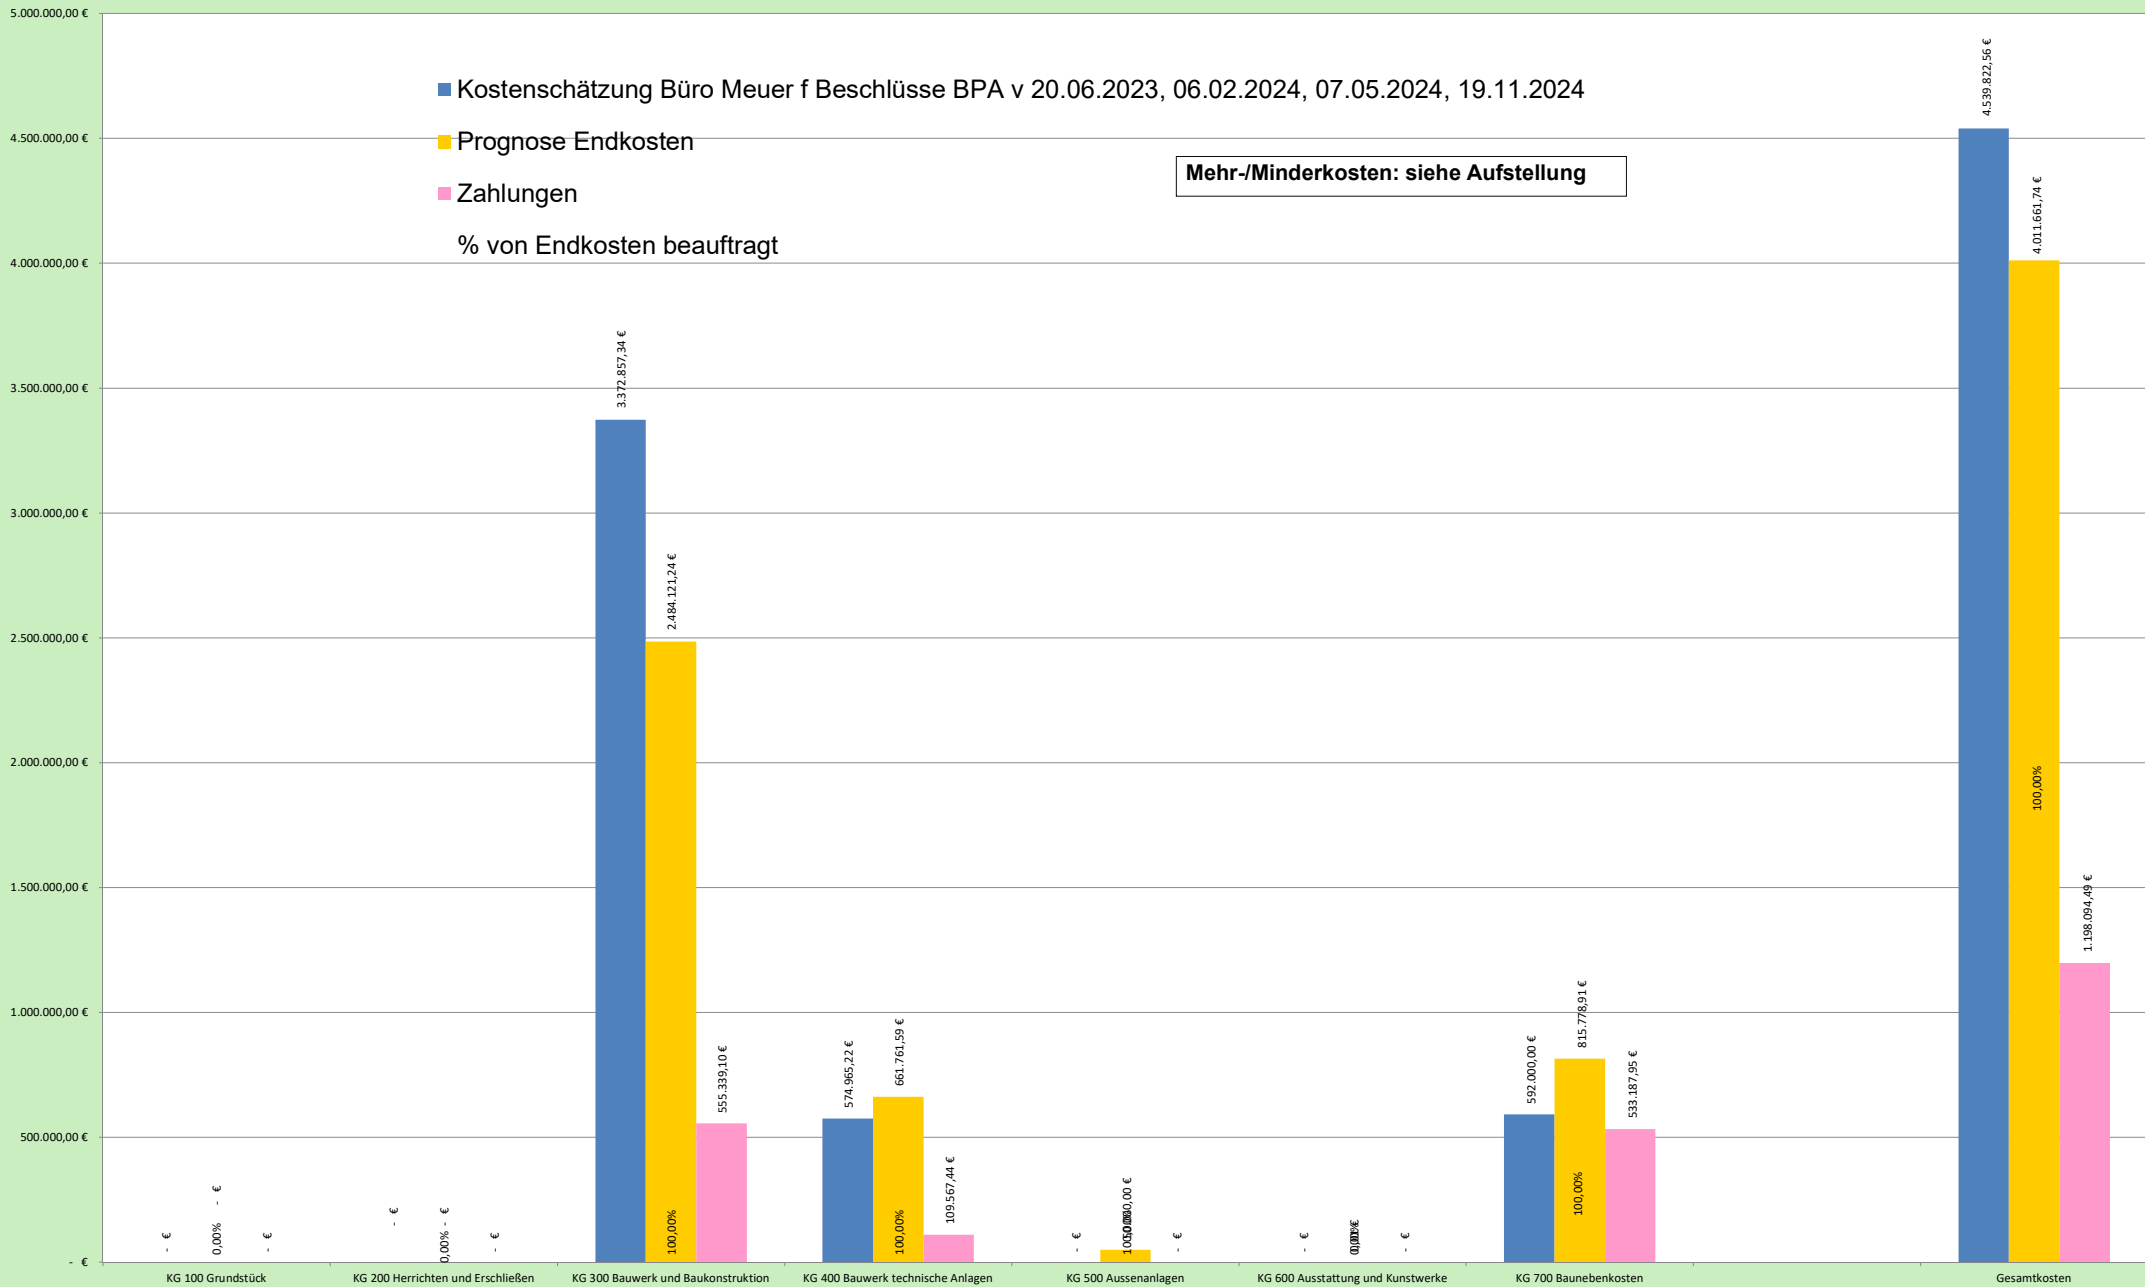

Mehr-/Minderkosten SANIERUNG GRUNDSCHULE

	Beschluss	Mehr/Minderkosten rechnerisch BPA Beschluss 30.03.2021	Mehr/Minderkosten gerundet
<b>Summe Grundstück</b>	- €	- €	- €
<b>Summe Erschliessung</b>	- €	- €	- €
Gewerk		- €	- €
Erdarbeiten für Ausweichcontainer		28.103,03 €	28.100,00 €
Ausweichcontainer	-	69.375,52 €	69.400,00 €
Baumeisterarbeiten		28.285,28 €	28.300,00 €
Trockenbau - Verbesserung Akustik in Klassen u Erneuerung Decken	-	539.334,89 €	539.300,00 €
Fassadensanierung - Putzfassade über Flachdach	-	101.938,46 €	101.900,00 €
Fassadensanierung - Malerarbeiten		225.736,22 €	225.700,00 €
Metallbauarbeiten - Außentüren/Fenster	-	39.204,00 €	39.200,00 €
Metallbauarbeiten - RS-Türen im Gebäude	-	141.451,30 €	141.500,00 €
Malerarbeiten	-	29.432,97 €	29.400,00 €
Schreinerarbeiten - Innentüren		17.352,87 €	17.400,00 €
Schreinerarbeiten - Erneuerung Garderoben		10.762,03 €	10.800,00 €
Bodenbelagsarbeiten - Lino	-	498.600,45 €	498.600,00 €
Bodenbelagsarbeiten - Fliesen		107.332,95 €	107.300,00 €
KMF-Sanierung - Flure und Gänge		0,00 €	- €
Malerarbeiten HK		0,00 €	- €
Estrich		15.000,00 €	15.000,00 €
Blechspinde		36.000,00 €	36.000,00 €
Gewerk		0,00 €	- €
Gewerk		0,00 €	- €
Gewerk		0,00 €	- €
Gewerk		0,00 €	- €
Flachdachsanierung		87.602,97 €	87.600,00 €
Gewerk		- €	- €
Baureinigung	-	25.573,87 €	25.600,00 €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
<b>Summe Bauwerk- Baukonstruktion</b>	<b>3.372.857,34 €</b>	<b>888.736,10 €</b>	<b>888.700,00 €</b>
Heizung		10.000,00 €	10.000,00 €
Sanitär		30.000,00 €	30.000,00 €
Lüftung		10.000,00 €	10.000,00 €
Elektro (Elektro + EDV: Smartboardtafeln u W-Lan)	-	78.357,74 €	78.400,00 €
Blitzschutz		76.154,11 €	76.200,00 €
Blitzschutz Erdarbeiten		4.000,00 €	4.000,00 €
Umbau Brandmeldeanlage		35.000,00 €	35.000,00 €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
<b>Summe Bauwerk Technische Anlagen</b>	<b>574.965,22 €</b>	<b>86.796,37 €</b>	<b>86.800,00 €</b>
Gewerk		50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Summe Aussenanlagen</b>	<b>- €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
Gewerk ...		- €	- €
Gewerk		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
<b>Summe Ausstattung</b>	<b>- €</b>	<b>0,01 €</b>	<b>- €</b>
Architekt		176.386,03 €	176.400,00 €
E-Technische Ausführung und Aufzug (ohne PV-Anlage???)	-	30.389,84 €	30.400,00 €
Gewerk		- €	- €
HLS-Technische Ausführung	-	5.166,43 €	5.200,00 €
Gewerk		- €	- €
SiGeKo		27.116,15 €	27.100,00 €
Brandschutz		10.000,00 €	10.000,00 €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	0
Gewerk		- €	- €
Prüfungsgebühren (z.B. Prüfstatik)		5.833,00 €	5.800,00 €
Luftschadstoffmessung		10.000,00 €	10.000,00 €
Büro		- €	- €
Allgemeine Baunebenkosten		30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Summe Baunebenkosten</b>	<b>592.000,00 €</b>	<b>223.778,91 €</b>	<b>223.800,00 €</b>
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>4.539.822,56 €</b>	<b>528.160,82 €</b>	<b>528.100,00 €</b>
Mehrung/Minderung in %	-11,63%		
