


### Umbau Rathaus

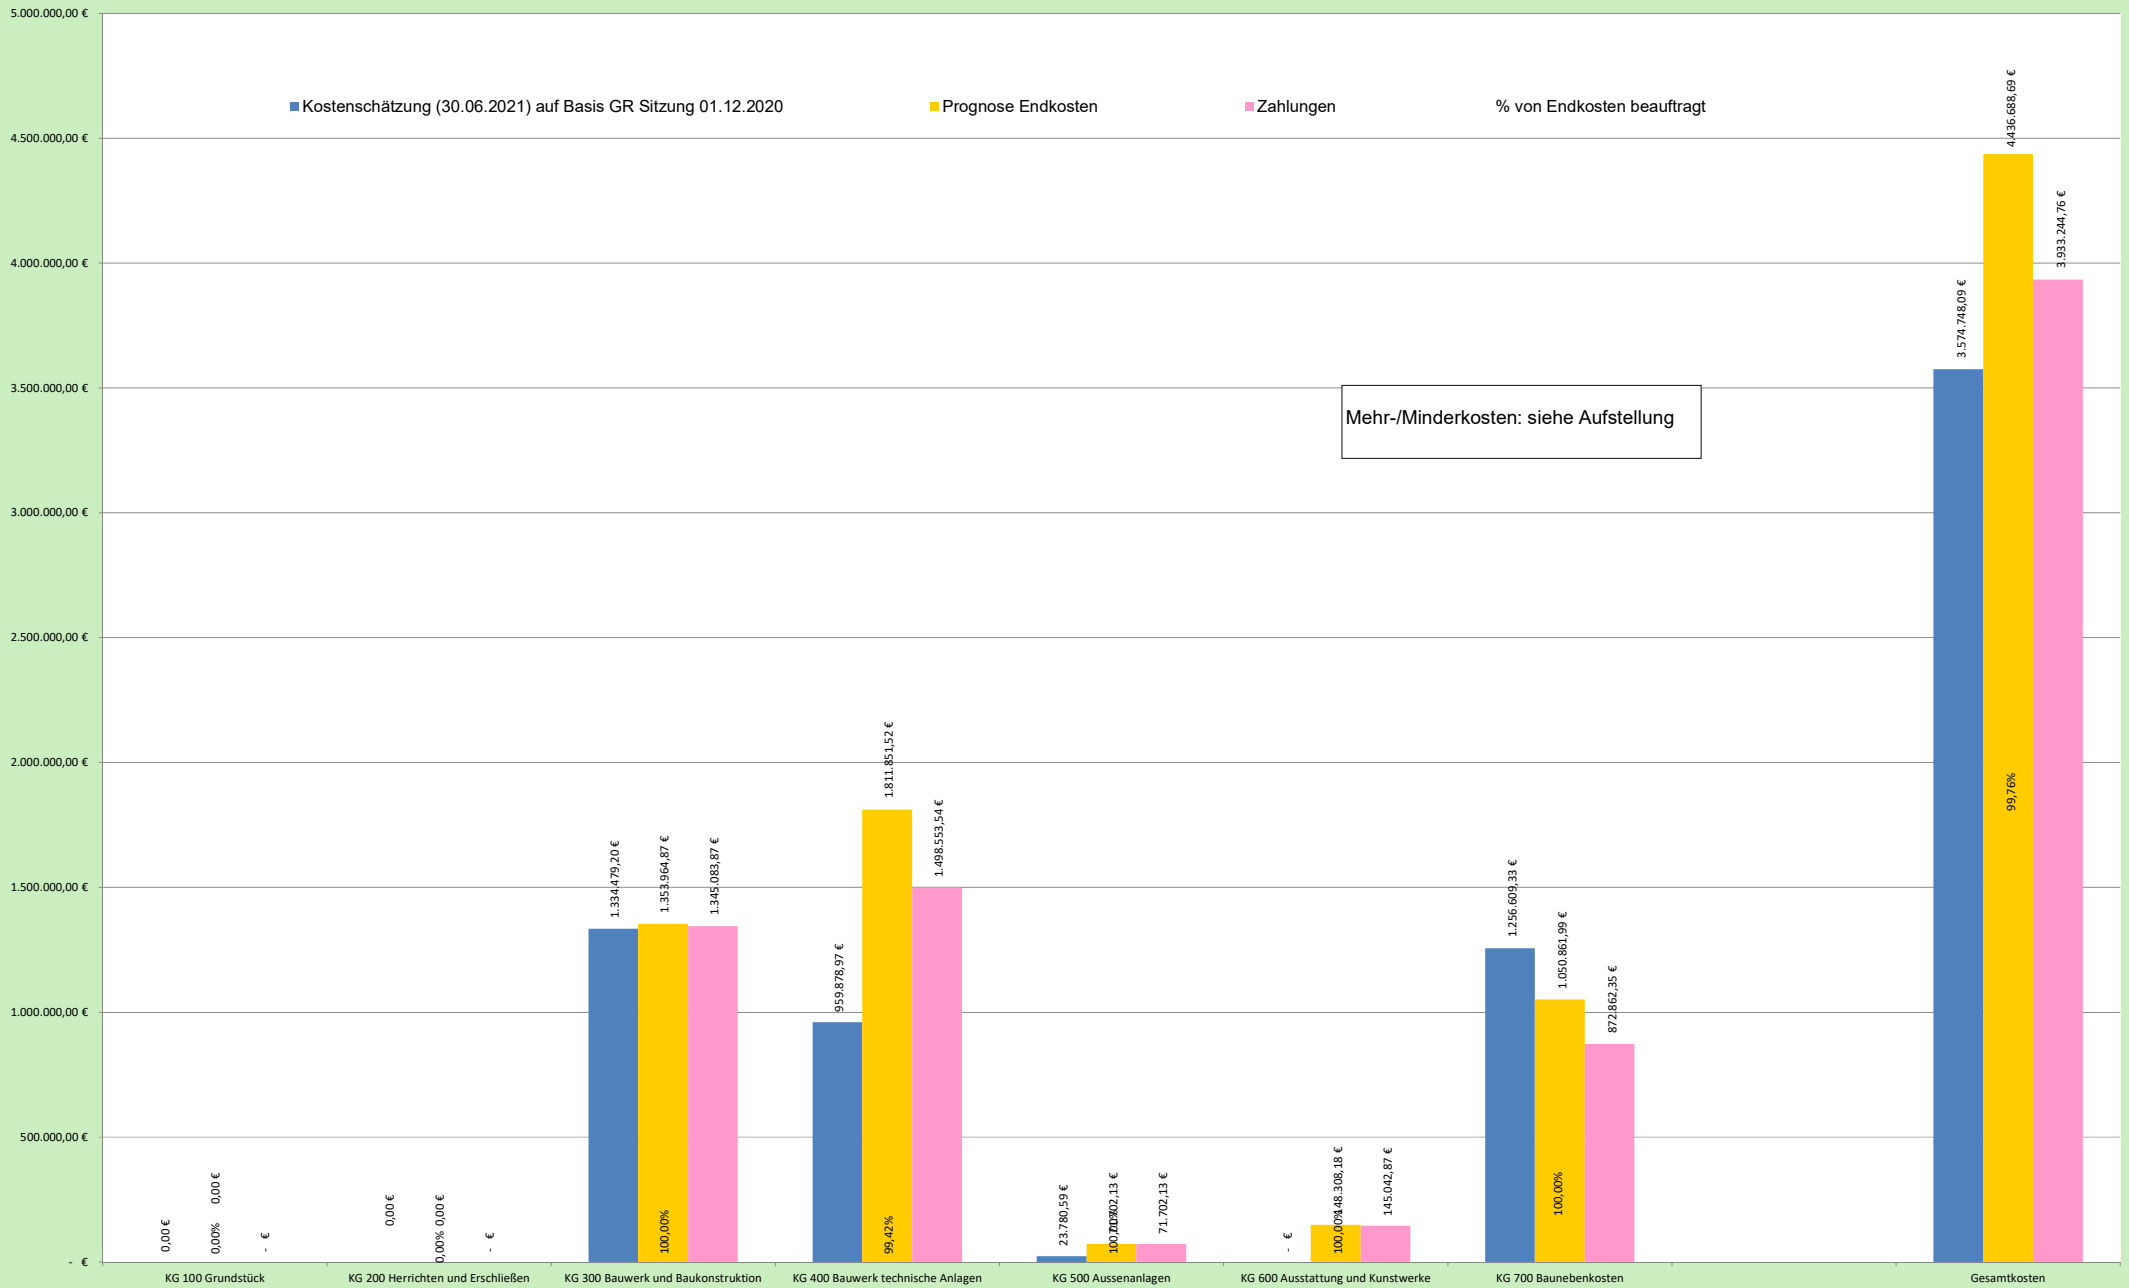

Mehr-/Minderkosten Umbau Rathaus

	Mehr/Minderkosten Kostenhauptgruppen	Mehr/Minderkosten rechnerisch zu Kosten 26.08.14	Mehr/Minderkosten gerundet
<b>Summe Grundstück</b>	- €	- €	- €
<b>Summe Erschliessung</b>	- €	- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Baumeisterarbeiten		48.072,68 €	48.100,00 €
Betonschneide-/Bohrarbeiten		6.116,60 €	6.100,00 €
Gewerk		- €	- €
Container Poststelle		0,00 €	- €
Erneuerung WDVS incl. Gerüst	-	775,48 €	800,00 €
Metallbauarbeiten (Fassadenbau)		21.182,37 €	21.200,00 €
Schreinerarbeiten incl. Türen		55.248,38 €	55.200,00 €
Schlosserarbeiten		- €	- €
Spenglerarbeiten (Attikaverblechung)		20.742,56 €	20.700,00 €
Trockenbau	-	16.168,69 €	16.200,00 €
Umbau Löschwassereinspeisung		- €	- €
Notüberläufe ins Flachdach		33.518,37 €	33.500,00 €
Sonnenschutzarbeiten	-	56.896,68 €	56.900,00 €
Schreinerarbeiten Bürgerbüro	-	105.800,46 €	105.800,00 €
Blendschutz innenliegend		909,86 €	900,00 €
Malerarbeiten	-	3.382,60 €	3.400,00 €
Naturstein-/Fliesenarbeiten/Natursteireinigung		21.732,41 €	21.700,00 €
Folienbeklebung Oberlichter Büroerweiterung		5.931,69 €	5.900,00 €
Ausrichtung Fensterbleche		34.967,32 €	35.000,00 €
Parkettarbeiten	-	3.178,63 €	3.200,00 €
Schliessung Simons u. Voss	-	3.972,67 €	4.000,00 €
Umzugsservice	-	32.240,14 €	32.200,00 €
Gebäudereinigung	-	9.040,29 €	9.000,00 €
Betonkosmetik		2.519,07 €	2.500,00 €
<b>Summe Bauwerk- Baukonstruktion</b>	<b>19.485,67 €</b>	<b>19.485,67 €</b>	<b>19.500,00 €</b>
Erneuerung BMA		131.228,43 €	131.200,00 €
Lüftung	-	502.970,67 €	503.000,00 €
MSR-Technik		162.538,17 €	162.500,00 €
Kühldecken		198.842,63 €	198.800,00 €
Sanitärinstallation		69.433,96 €	69.400,00 €
Elektroinstallation		224.200,43 €	224.200,00 €
ELT Leistungserhöhung Stromanschluss		504,00 €	500,00 €
Sanierung Brandschutz an Inst Schächte		9.448,04 €	9.400,00 €
Kälte/Heizungstechnisch/MSR Installation		554.690,06 €	554.700,00 €
Elektrogeräte	-	0,00 €	- €
<b>Summe Bauwerk Technische Anlagen</b>	<b>851.972,55 €</b>	<b>847.915,05 €</b>	<b>847.900,00 €</b>
Freiflächenarbeiten		47.921,54 €	47.900,00 €
<b>Summe Aussenanlagen</b>	<b>47.921,54 €</b>	<b>47.921,54 €</b>	<b>47.900,00 €</b>
Möblierung lose		148.308,18 €	148.300,00 €
Gewerk ...		- €	- €
Gewerk ...	0	- €	- €
Gewerk ...		- €	- €
Gewerk ....		- €	- €
Gewerk ...		- €	- €
<b>Summe Ausstattung</b>	<b>148.308,18 €</b>	<b>148.308,18 €</b>	<b>148.300,00 €</b>
Architekten und Ingenieure		96,84 €	100,00 €
Prüfung der Gleitreibung des Foyerbodens		1.627,92 €	1.600,00 €
Prüfsachverständiger Lüftung		4.059,09 €	4.100,00 €
Tragwerksplanung - Betonausschnitte		1.303,40 €	1.300,00 €
Elektro-Technische Ausrüstung (ohne PV-Anlage)		21.045,17 €	21.000,00 €
HLS-Technische Ausrüstung	-	289.273,23 €	289.300,00 €
Kassensicherheit		755,53 €	800,00 €
Thermische Bauphysik Wärmeschutz nach EnEV		2.952,69 €	3.000,00 €
Schallschutz und Raumakustik	-	1.073,00 €	1.100,00 €
Vermessungen/Einmessungen		952,00 €	1.000,00 €
SIGE-Koordinator	-	10.664,40 €	10.700,00 €
Brandschutzgutachten		3.022,60 €	3.000,00 €
Sachverständigenprüfung BMA		1.785,00 €	1.800,00 €
Gutachten Dachabdichtung		2.894,68 €	2.900,00 €
Gewerk		- €	- €
Allgemeine Baunebenkosten		54.768,37 €	54.800,00 €
<b>Summe Baunebenkosten</b>	<b>- 205.747,34 €</b>	<b>- 205.747,34 €</b>	<b>- 205.700,00 €</b>
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>861.940,60 €</b>	<b>857.883,10 €</b>	<b>857.900,00 €</b>
Mehrung/Minderung in %	24,11%		

Vergebene Leistung			
Ausschreibung läuft			
Schlussgerechnet			
