


Sanierung Grundschule - Kostenverfolgung

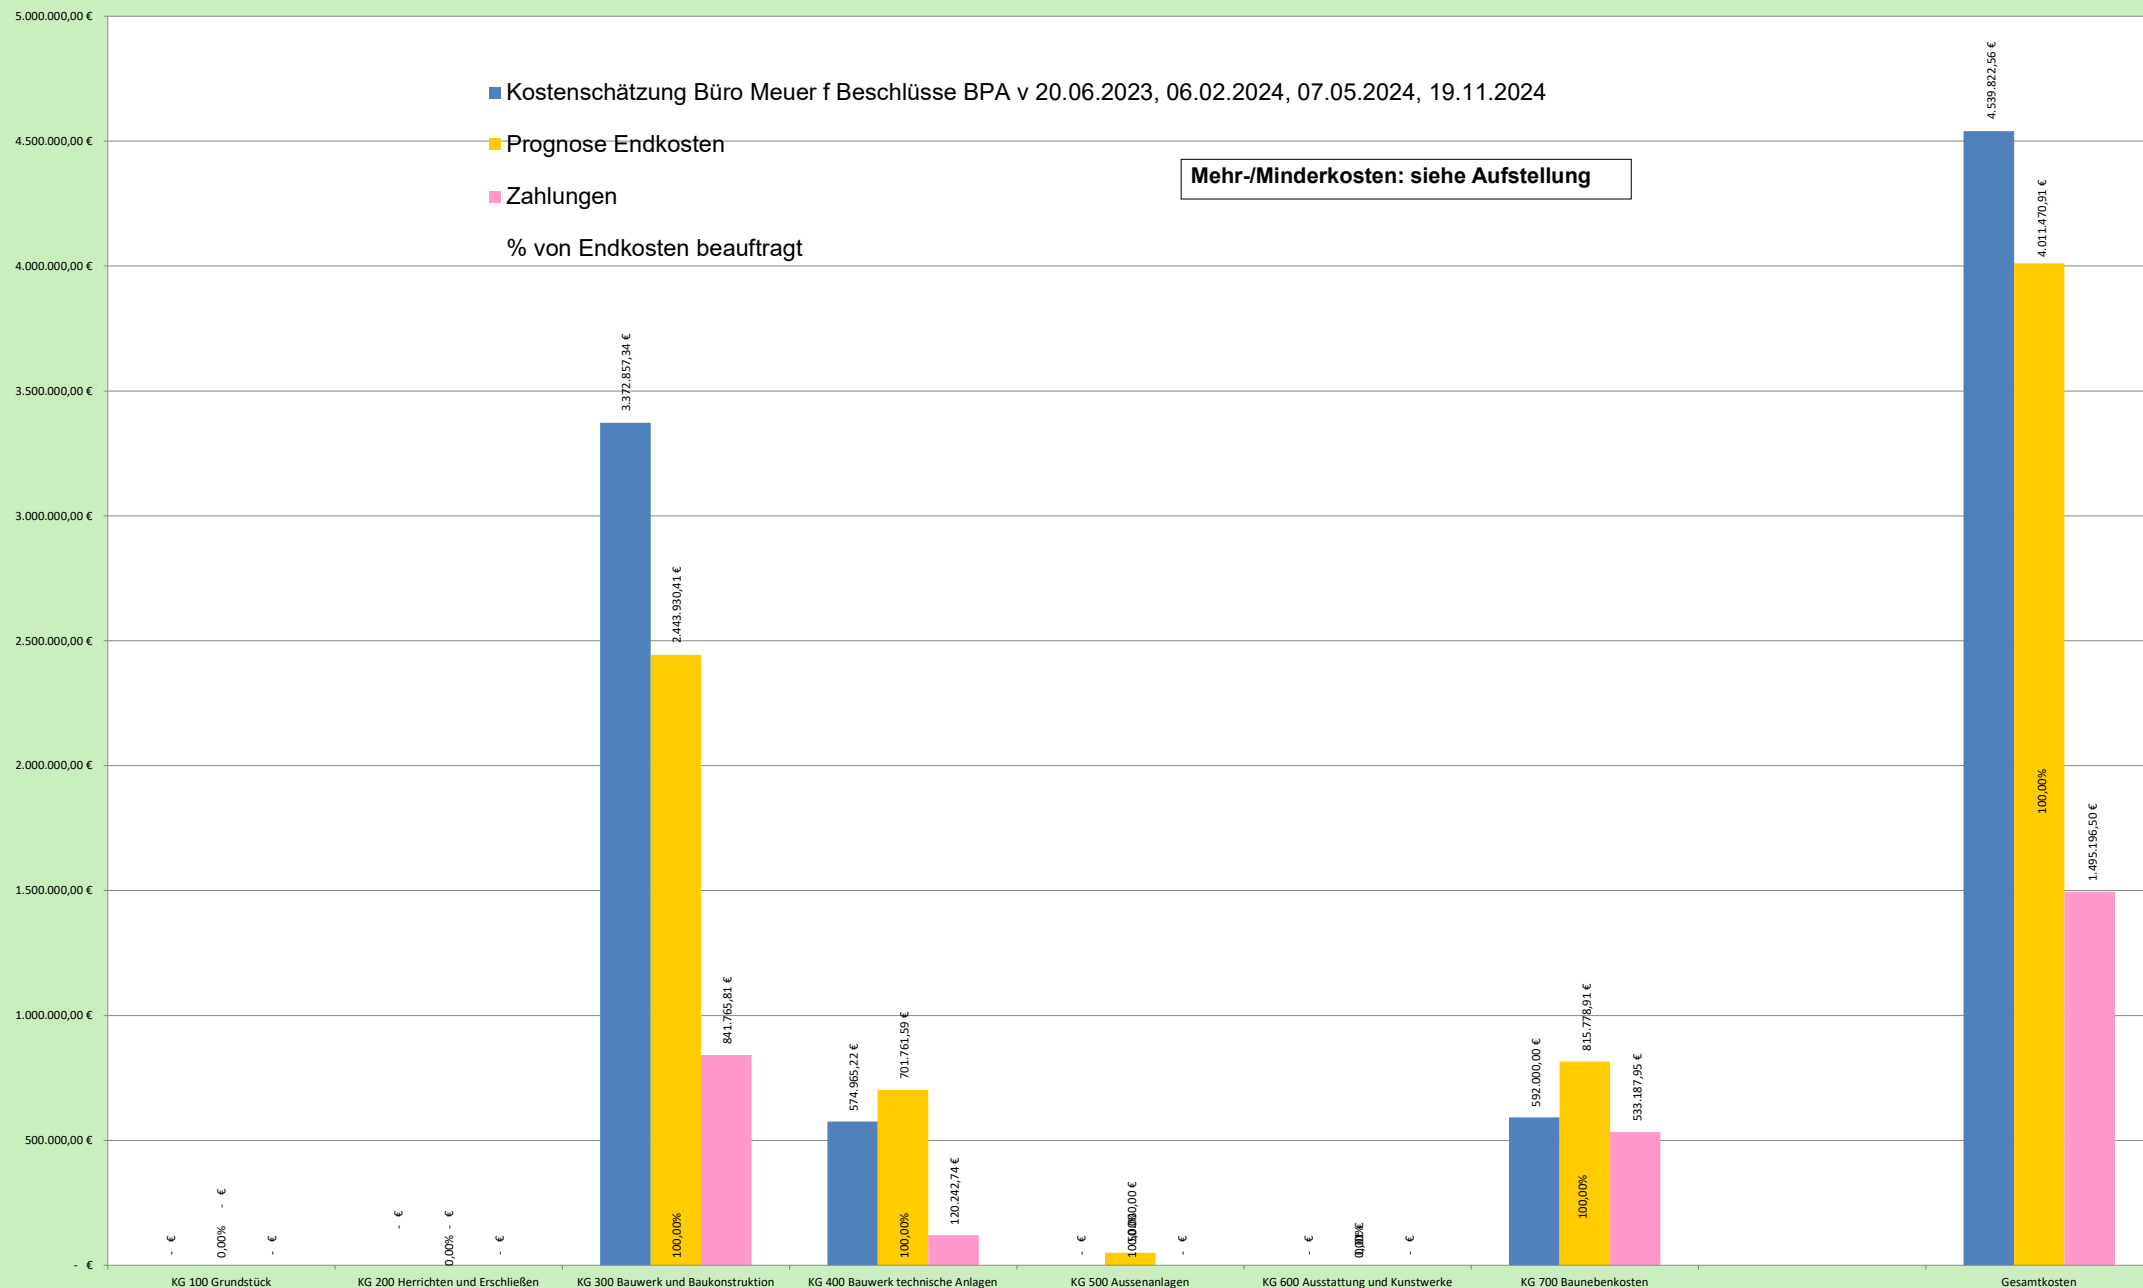

Mehr-/Minderkosten SANIERUNG GRUNDSCHULE

	Beschluss	Mehr/Minderkosten rechnerisch BPA Beschluss 30.03.2021	Mehr/Minderkosten gerundet
Summe Grundstück	- €	- €	- €
Summe Erschliessung	- €	- €	- €
Gewerk		- €	- €
Erdarbeiten für Ausweichcontainer		28.103,03 €	28.100,00 €
Ausweichcontainer	-	79.375,52 €	79.400,00 €
Baumeisterarbeiten		28.285,28 €	28.300,00 €
Trockenbau - Verbesserung Akustik in Klassen u Erneuerung Decken	-	579.334,89 €	579.300,00 €
Fassadensanierung - Putzfassade über Flachdach	-	113.938,46 €	113.900,00 €
Fassadensanierung - Malerarbeiten		225.736,22 €	225.700,00 €
Metallbauarbeiten - Außentüren/Fenster	-	39.204,00 €	39.200,00 €
Metallbauarbeiten - RS-Türen im Gebäude	-	141.451,30 €	141.500,00 €
Malerarbeiten	-	29.432,97 €	29.400,00 €
Schreinerarbeiten - Innentüren		17.352,87 €	17.400,00 €
Schreinerarbeiten - Erneuerung Garderoben		10.762,03 €	10.800,00 €
Bodenbelagsarbeiten - Lino	-	498.600,45 €	498.600,00 €
Bodenbelagsarbeiten - Fliesen		107.332,95 €	107.300,00 €
KMF-Sanierung - Flure und Gänge		0,00 €	- €
Malerarbeiten HK		0,00 €	- €
Estrich		10.759,55 €	10.800,00 €
Blechspinde		38.914,99 €	38.900,00 €
Montage Sonnenschutz		10.000,00 €	10.000,00 €
Lackierarbeiten Innengeländer, Glastrennwände		12.000,00 €	12.000,00 €
Gewerk		0,00 €	- €
Gewerk		0,00 €	- €
Flachdachsanierung		87.602,97 €	87.600,00 €
Gewerk		- €	- €
Baureinigung	-	25.573,87 €	25.600,00 €
Schließanlage		1.134,63 €	1.100,00 €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Summe Bauwerk- Baukonstruktion	3.372.857,34 €	- 928.926,94 €	- 928.900,00 €
Heizung		10.000,00 €	10.000,00 €
Sanitär		30.000,00 €	30.000,00 €
Lüftung		50.000,00 €	50.000,00 €
Elektro (Elektro + EDV: Smartboardtafeln u W-Lan)	-	78.357,74 €	78.400,00 €
Blitzschutz		76.154,11 €	76.200,00 €
Blitzschutz Erdarbeiten		4.000,00 €	4.000,00 €
Umbau Brandmeldeanlage		35.000,00 €	35.000,00 €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Summe Bauwerk Technische Anlagen	574.965,22 €	126.796,37 €	126.800,00 €
Gewerk		50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Aussenanlagen	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gewerk ...		- €	- €
Gewerk		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Gewerk ...		0,00 €	- €
Summe Ausstattung	- €	0,01 €	- €
Architekt		176.386,03 €	176.400,00 €
E-Technische Ausführung und Aufzug (ohne PV-Anlage???)	-	30.389,84 €	30.400,00 €
Gewerk		- €	- €
HLS-Technische Ausführung	-	5.166,43 €	5.200,00 €
Gewerk		- €	- €
SiGeKo		27.116,15 €	27.100,00 €
Brandschutz		10.000,00 €	10.000,00 €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	- €
Gewerk		- €	0
Gewerk		- €	- €
Prüfungsgebühren (z.B. Prüfstatik)		5.833,00 €	5.800,00 €
Luftschadstoffmessung		10.000,00 €	10.000,00 €
Büro		- €	- €
Allgemeine Baunebenkosten		30.000,00 €	30.000,00 €
Summe Baunebenkosten	592.000,00 €	223.778,91 €	223.800,00 €
Gesamtkosten:	4.539.822,56 €	- 528.351,65 €	- 528.300,00 €
Mehrung/Minderung in %		-11,64%	
