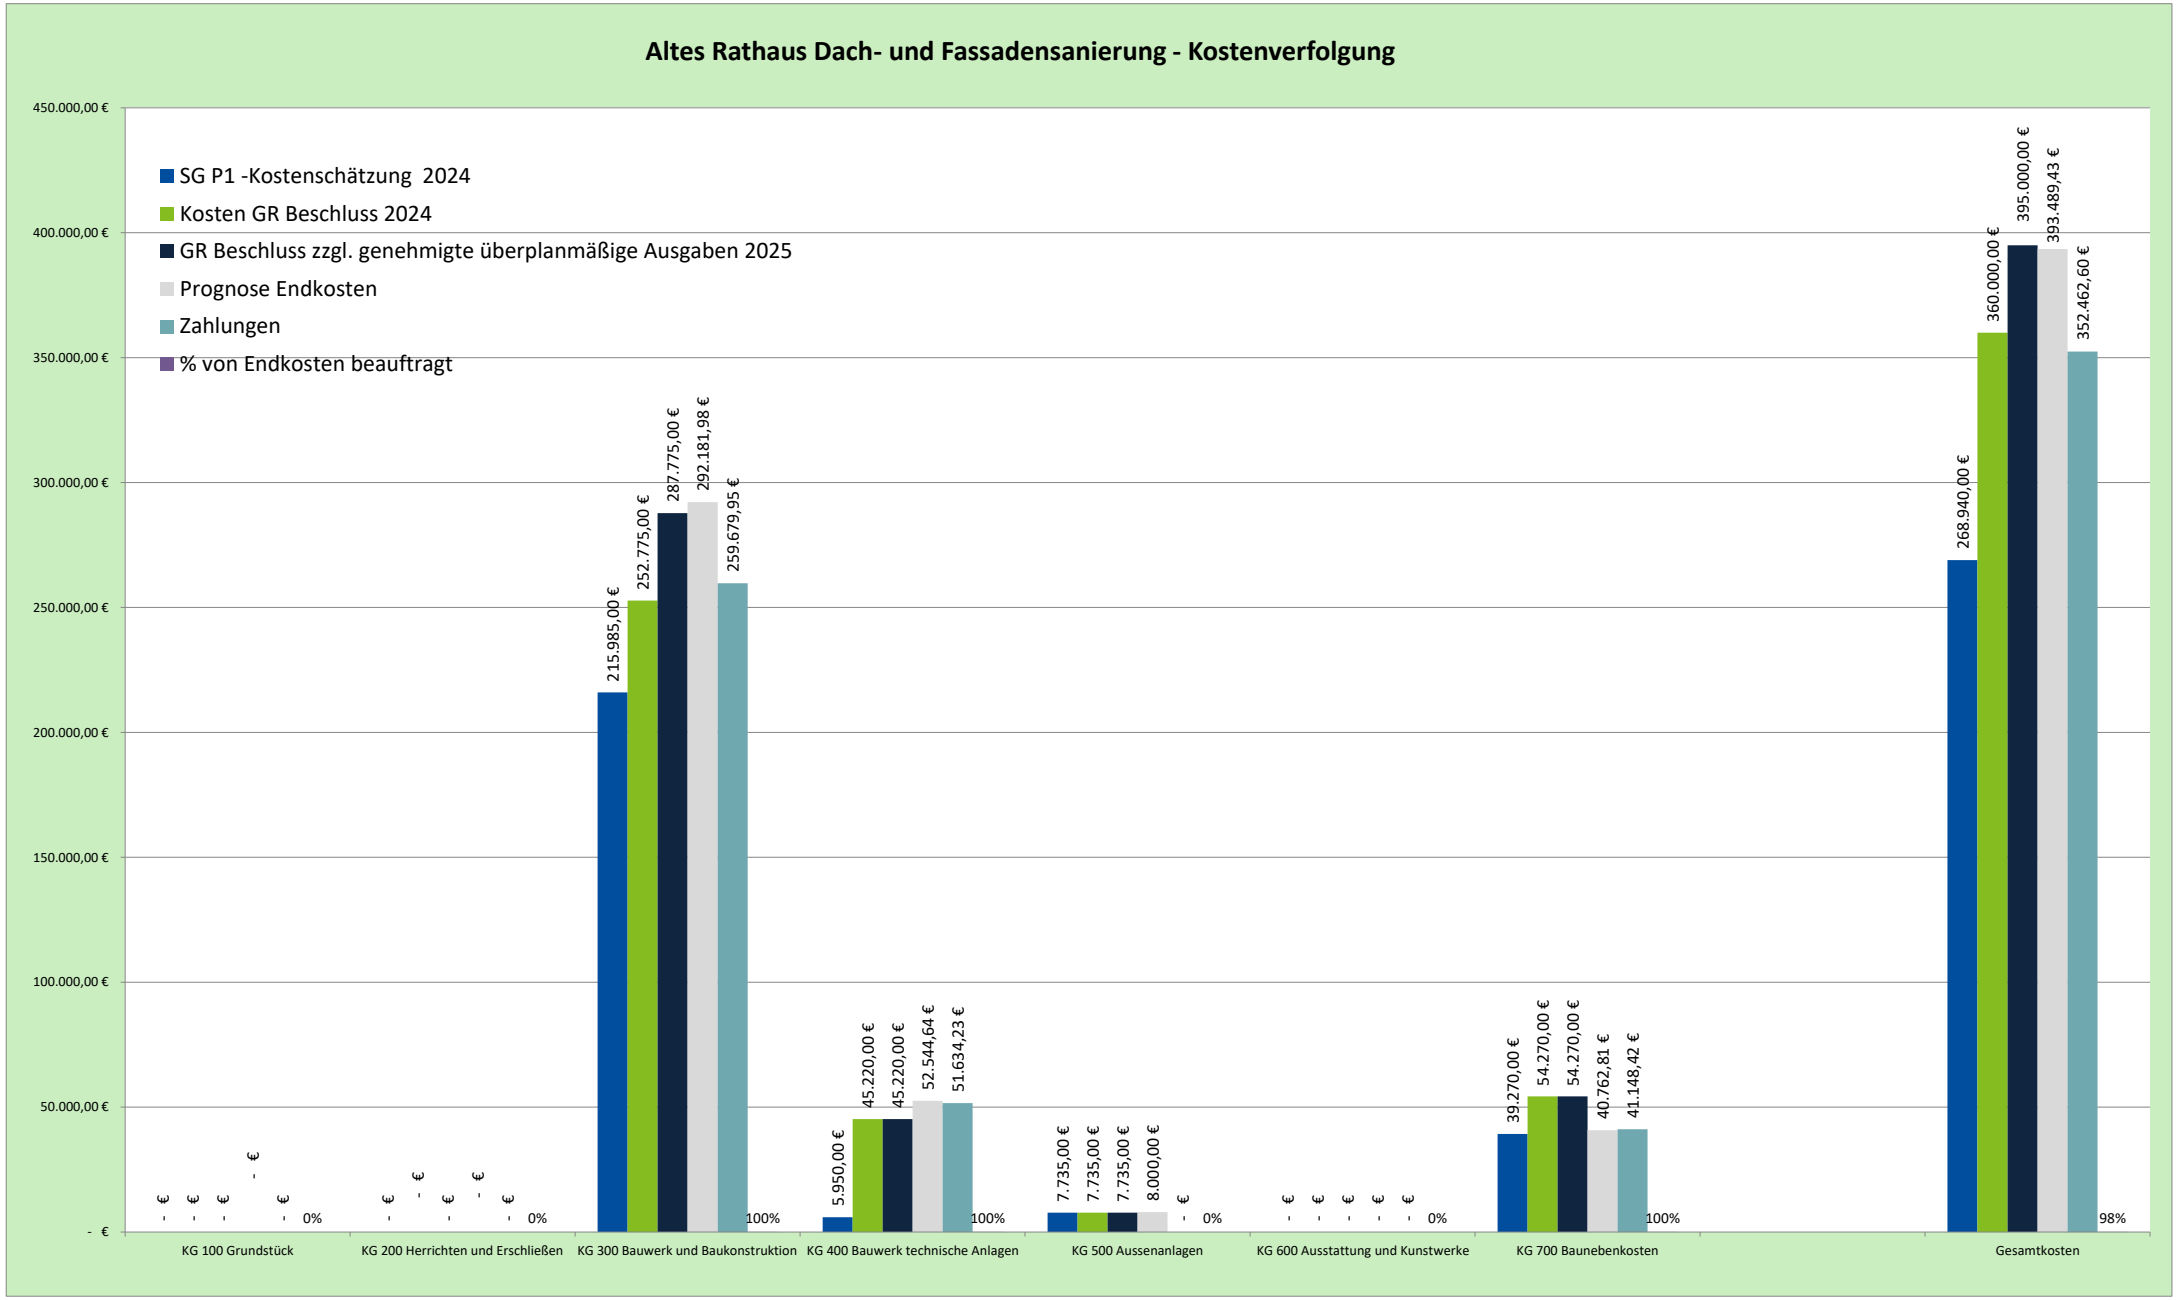
Altes Rathaus Dach- und Fassadensanierung - Kostenverfolgung
SG P1 -Kostenschätzung 2024
Kosten GR Beschluss 2024
GR Beschluss zzgl. genehmigte überplanmäßige Ausgaben 2025
Prognose Endkosten
Zahlungen
% von Endkosten beauftragt
450.000,00 €
400.000,00 €
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
- €
KG 100 Grundstück
KG 200 Herrichten und Erschließen
KG 300 Bauwerk und Baukonstruktion
215.985,00 €
252.775,00 €
287.775,00 €
292.181,98 €
259.679,95 €
100%
KG 400 Bauwerk technische Anlagen
5.950,00 €
45.220,00 €
45.220,00 €
52.544,64 €
51.634,23 €
100%
KG 500 Aussenanlagen
7.735,00 €
7.735,00 €
7.735,00 €
8.000,00 €
0%
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke
0%
KG 700 Baunebenkosten
39.270,00 €
54.270,00 €
54.270,00 €
40.762,81 €
41.148,42 €
100%
Gesamtkosten
268.940,00 €
360.000,00 €
395.000,00 €
393.489,43 €
352.462,60 €
98%
